
Id		Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
1				**ADC**	**lun 01/02/16**	**lun 31/10/22**	**64%**	**ICSIC**
2				**Acceso Universal**	**lun 01/02/16**	**vie 31/12/21**	**81%**	**ICSIC**
3			**1**	**Reducir la brecha de infraestructura que persiste en la entidad, facilitando a los colimenses la conectividad a redes de telecomunicaciones que sean seguras, confiables y de calidad adecuada.**	**lun 01/02/16**	**vie 31/12/21**	**81%**	**Desarrollo Telemático**
4			**1.1**	**Todas las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado contarán con infraestructura tecnológica que faciliten la comunicación entre las dependencias y ofrezcan de manera oportuna y sencilla los trámites y servicios del estado**	**lun 01/02/16**	**vie 31/12/21**	**96%**	**Desarrollo Telemático**
5			**1.1.1**	**Contar con un repositorio de proyectos de infraestructura de todo el Estado**	**lun 27/01/20**	**mar 24/03/20**	**33%**	**Desarrollo Telemático**
6				Definir estructura de repositorio (Conceptos, Tipos de Archivos, accesos)	mié 05/02/20	mar 11/02/20	100%	Desarrollo Telemático
7				Definir ubicación de repositorio (inmueble y servidor)	lun 27/01/20	vie 07/02/20	0%	Desarrollo Telemático
8				Convocar a dependencias participantes por oficio	mié 04/03/20	mar 10/03/20	100%	Desarrollo Telemáti
9				Implementación de servidor y puesta en producción	mié 11/03/20	mar 24/03/20	0%	Desarrollo Telemático
10			**1.1.2**	**Constituir una Comisión de Infraestructura Tecnológica cuya responsabilidad será fomentar la coordinación entre responsables de infraestructura, abatir proyectos aislados, identificar economías de escala y fomentar eficiencia y eficacia**	**mar 21/01/20**	**mar 03/03/20**	**100%**	**Desarrollo Telemático**

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
11			Elaborar propuesta de acta de instalación	mié 05/02/20	mar 11/02/20	100%	Desarrollo Telemáti
12			Definir Listado de Integrantes de la Comisión	mar 21/01/20	vie 24/01/20	100%	Desarrollo Telemáti
13			Convocar a participantes por oficio	mié 12/02/20	mar 25/02/20	100%	Desarrollo Telemáti
14			Realizar reunión y formalizar Comisión	mié 26/02/20	mar 03/03/20	100%	Desarrollo Telemáti
15		**1.1.3**	**Realizar un diagnóstico de la infraestructura de telecomunicaciones de las distintas dependencias para identificar las necesidades de conectividad**	**mié 05/02/20**	**mié 30/06/21**	**15%**	**Desarrollo Telemático**
16			Elaboración de Encuesta	mié 05/02/20	mar 11/02/20	100%	Desarrollo Telemáti
17			Preparación de encuesta a traves de Google Forms	mié 12/02/20	mar 25/02/20	0%	Desarrollo Telemáti
18			Notificación a encargados de sistemas y Telecomunicaciones de las Dependencias	mié 26/02/20	mar 03/03/20	100%	Desarrollo Telemático
19			Aplicación de formulario	mié 04/03/20	mar 17/03/20	100%	Desarrollo Telemáti
20			Concentración de Información	mié 18/03/20	mar 31/03/20	0%	Desarrollo Telemáti
21			Elaboración de Dictamen	mié 01/04/20	mar 28/04/20	0%	Desarrollo Telemáti
22			Tareas en monitor	vie 19/03/21	mié 30/06/21	0%	Desarrollo Telemáti
23		**1.1.4**	**Levantar un padrón de infraestructura tecnológica propiedad del Estado que fomente el intercambio tecnológico entre áreas y auxilie en la continuidad del servicio garantizando el mejor uso de cada uno**	**lun 02/03/20**	**mar 07/07/20**	**6%**	**Desarrollo Telemático**
24			Elaborar padrón derivado de la línea 1.1.1	lun 02/03/20	vie 06/03/20	100%	Desarrollo Telemáti
25			Definir procedimiento de actualización del padrón y notificación	lun 02/03/20	vie 06/03/20	0%	Desarrollo Telemático
26			Compartir el padrón y procedimiento de actualización	lun 09/03/20	mar 10/03/20	0%	Desarrollo Telemático

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

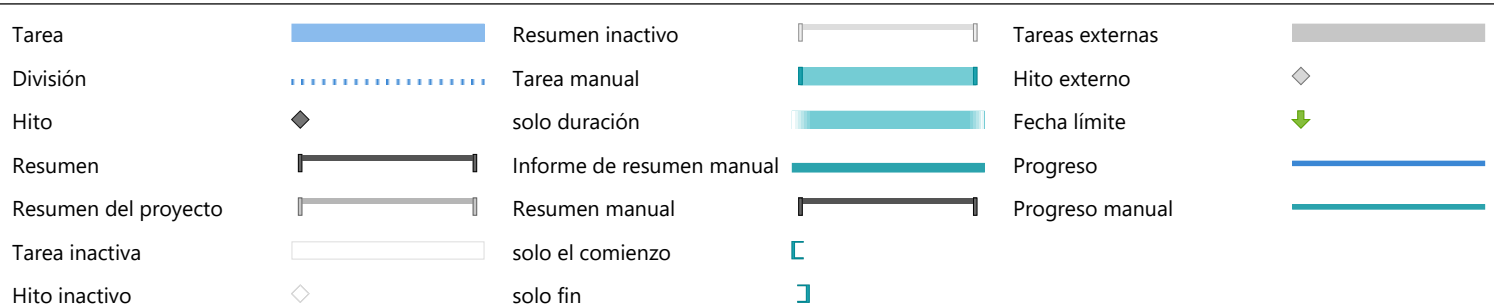


Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
27			**Implementar servicios de hospedaje de sistemas web, así como respaldos en alta disponibilidad para las bases de datos e información digital de las dependencias del ejecutivo del Estado**	**mié 01/04/20**	**mar 07/07/20**	**0%**	**Desarrollo Telemático**
28			Definir recursos involucrados en el proceso	mié 01/04/20	mar 14/04/20	0%	Desarrollo Telemáti
29			Generar proceso de hospedaje y respaldo	mié 15/04/20	mar 30/06/20	0%	Desarrollo Telemáti
30			Publicar y difundir proceso de hospedaje y respaldo de información en el SGC	mié 01/07/20	mar 07/07/20	0%	Desarrollo Telemático
31		**1.1.5**	**Establecer un presupuesto anual, sostenible y claro, que el Estado dedicará a la conectividad. El presupuesto debe privilegiar el mantenimiento de lo existente.**	**lun 01/02/16**	**vie 31/12/21**	**99%**	**Desarrollo Telemático,Direcció General**
32			Analizar y gestionar el monto requerido para operación, mantenimiento y mejora de la conectividad 2020	mar 01/10/19	vie 29/11/19	100%	Desarrollo Telemático,Direcció General
33			Formalizar el establecimiento de el presupuesto anual en el presupuesto de egresos del Gobierno del Edo	lun 02/12/19	vie 06/12/19	100%	Desarrollo Telemático,Direcció General
34			Gestionar en el presupuesto 2021 se consideren los recursos requeridos para esta línea de acción	mié 01/07/20	lun 31/08/20	100%	Desarrollo Telemático,Direcció
35			**Mantenimientos a la infraestructura de telecomunicaciones del Gobierno del Estado**	**lun 01/02/16**	**vie 31/12/21**	**99%**	**Desarrollo Telemático**
36			Actualización de switch's de la red de datos del Complejo de Gobierno	jue 01/12/16	mar 28/02/17	100%	Desarrollo Telemático
37			**Servicio de Internet simétrico de alta velocidad**	**dom 01/01/17**	**mar 31/12/19**	**99%**	**Desarrollo Telemát**

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

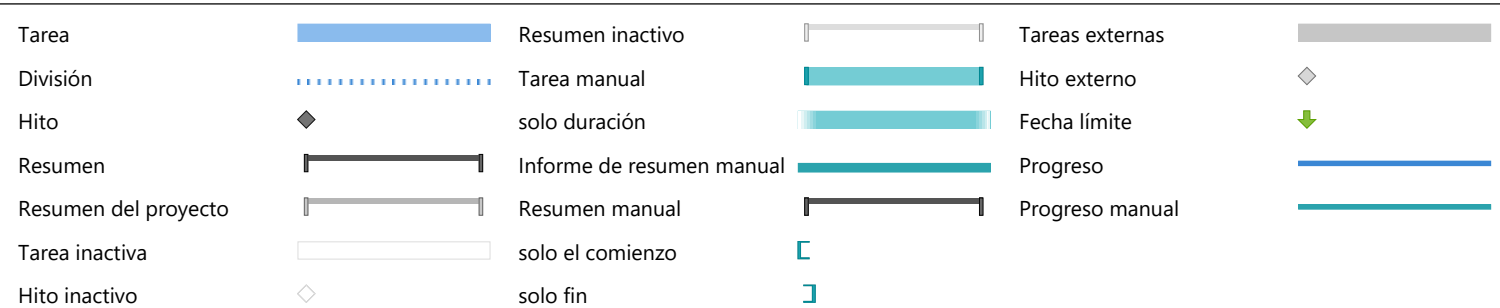

Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
38			Contrato primer trienio	dom 01/01/17	mar 31/12/19	100%	Desarrollo Telemáti
39			Generar anexo técnico para requerir adjudicación de proveedor	mar 07/01/20	vie 28/02/20	100%	Desarrollo Telemático,Direcció
40			Seguimiento a condiciones de Contratación 500 MG	dom 27/09/20	vie 31/12/21	100%	Desarrollo Telemático,Direcció
41			Seguimiento a condiciones de Contratación 100 MG	dom 27/09/20	vie 31/12/21	100%	Desarrollo Telemático,Direcció
42			Seguimiento a condiciones de Contratación 40 MG	dom 27/09/20	vie 31/12/21	100%	Desarrollo Telemático,Direcció
43			**Puerta de enlace**	**dom 01/01/17**	**vie 31/12/21**	**99%**	**Desarrollo Telemáti**
44			Seguimiento a condiciones de Contratación	dom 01/01/17	jue 31/12/20	100%	Desarrollo Telemáti
45			Realizar al menos 2 mantenimientos a la infraestructura de telecomunicaciones	lun 01/02/16	dom 31/10/21	100%	Desarrollo Telemático
46			Actualización de correo electrónico institucional	mié 22/11/17	dom 31/12/17	100%	Desarrollo Telemático
47			Equipamiento de IDF's con UPS's	mar 02/01/18	mié 31/01/18	100%	Desarrollo Telemáti
48			Reemplazo de conmutador de telefonía y cambio de terminales telefónicas de varias dependencias	dom 04/02/18	vie 28/06/19	99%	Desarrollo Telemático
49			Remplazo Conmutador	dom 04/02/18	lun 31/12/18	100%	Desarrollo Telemáti
50			Cambio de terminales telefónicas en por lo menos 10 dependencias	mié 02/01/19	vie 28/06/19	100%	Desarrollo Telemático
51			Actualización de servidor y sistema de firma electrónica	lun 16/07/18	lun 31/12/18	100%	Desarrollo Telemático

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21




Id		Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
52				50 Licencia de plataforma para video conferencias	dom 15/03/20	jue 30/09/21	100%	Desarrollo Telemático
53			**1.2**	**Lograr una cobertura de banda ancha, con velocidad mínima de 2 Mbps de descarga, superior al 90% de los hogares**	**jue 01/06/17**	**vie 31/12/21**	**47%**	**Desarrollo Telemático**
54			**1.2.1**	**Establecer conjuntamente con la Federación las métricas de calidad de servicio y el ritmo al que crecerán los sitios conectados. Comprometer el levantamiento de encuestas de uso y satisfacción de usuario, así como su publicidad**	**mar 28/01/20**	**vie 31/01/20**	**100%**	**Desarrollo Telemático**
55				Solicitar a la IFT las métricas de calidad de servicio	mar 28/01/20	vie 31/01/20	100%	Desarrollo Telemáti
56			**1.2.2**	**Promover una simplificación y homologación de los procesos municipales para el proceso de entrega de permisos para el despliegue de redes de telecomunicaciones**	**jue 23/07/20**	**vie 31/12/21**	**69%**	**SEFOME**
57				**Primera etapa 8 municipios**	**jue 23/07/20**	**vie 31/12/21**	**79%**	**Coordinación Técni**
58				Carta de intención firmada el municipio	jue 23/07/20	jue 06/08/20	100%	Coordinación Técnic
59				Mapeo regulatorio por parte del municipio	vie 07/08/20	lun 17/08/20	100%	Coordinación Técnic
60				Adaptación de marco regulatorio municipal	mar 18/08/20	jue 17/09/20	100%	Coordinación Técnic
61				Análisis de Marco Regulatorio por parte de la CONAMER	vie 18/09/20	vie 09/10/20	100%	Coordinación Técnica,SEFOME
62				Validar Análisis de Marco Regulatorio	lun 12/10/20	dom 25/10/20	100%	Coordinación Técnic
63				Elaboración de diagnóstico por parte de CONAMER	lun 26/10/20	mar 10/11/20	100%	Coordinación Técnica,SEFOME

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
64			Tarea para actualizar % de acuerdo a la cantidad de municipios en primera etapa	sáb 01/05/21	vie 31/12/21	100%	Coordinación Técnica,SEFOME
65			Los municipios someten al Cabildo y al poder Legislativo los documentos correspondientes	mar 04/05/21	mié 30/06/21	17%	Coordinación Técnica,SEFOME
66			Los municipios envían a CONAMER los documentos aprobados	dom 01/08/21	mié 01/09/21	0%	Coordinación Técnica,SEFOME
67			CONAMER valida y en su caso emite Certificado PROREFORMA	mié 14/07/21	mié 28/07/21	0%	Coordinación Técnica,SEFOME
68			**Segunda etapa 2 municipios**	**jue 23/07/20**	**mar 30/11/21**	**43%**	**Coordinación Técni**
69			Carta de intención firmada el municipio	jue 23/07/20	jue 06/08/20	100%	SEFOME
70			Mapeo regulatorio por parte del municipio	vie 07/08/20	lun 17/08/20	100%	SEFOME
71			Adaptación de marco regulatorio municipal	mar 18/08/20	jue 17/09/20	100%	SEFOME
72			Análisis preliminar del Marco Regulatorio por parte de la CONAMER	vie 18/09/20	vie 09/10/20	100%	SEFOME
73			Elaboración de diagnóstico preliminar y porcentaje de la calificación (preliminar)por parte de CONAMER	lun 12/10/20	dom 25/10/20	0%	SEFOME
74			Modifican los municipios marco regulatorio (cobro)	mié 15/09/21	dom 10/10/21	0%	SEFOME
75			CONAMER recibe modificaciones y emite visto bueno	vie 15/10/21	lun 25/10/21	0%	SEFOME
76			Los municipios someten al Cabildo y al poder Legislativo los documentos correspondientes	mié 27/10/21	jue 11/11/21	0%	SEFOME
77			Los municipios publican el marco regulatorio en el período oficial del Estado	vie 12/11/21	lun 22/11/21	0%	SEFOME

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

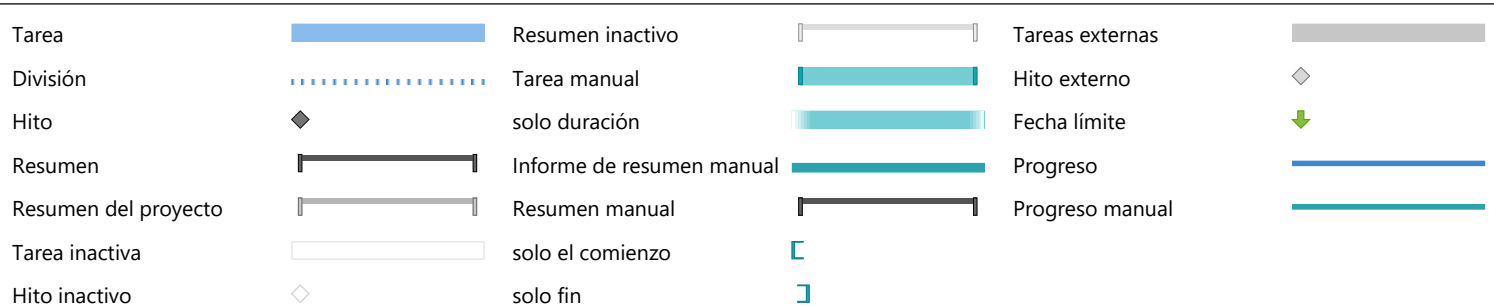

Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
78			Los municipios publican en su sitio web el marco regulatorio y la ficha del trámite junto con los formatos descargables	mar 23/11/21	dom 28/11/21	0%	SEFOME
79			Los municipios envían a CONAMER, la publicación del marco regulatorio y evidencia de la publicación en el sitio web del municipio	dom 28/11/21	mar 30/11/21	0%	SEFOME
80			CONAMER valida y en su caso emite Certificado PROREFORMA	mar 01/12/20	mar 15/12/20	0%	SEFOME
81		**1.2.3**	**Desarrollar, publicar y actualizar periódicamente el mapa de cobertura de banda ancha fija y móvil del estado**	**mar 28/01/20**	**mar 31/03/20**	**100%**	**Desarrollo Telemático**
82			Publicar en el habilitador de acceso universal el mapa de cobertura de telefonía celular publicado por IFT	mar 28/01/20	mar 31/03/20	100%	Desarrollo Telemático
83		**1.2.4**	**Gestionar con las empresas de telecomunicaciones un plan de expansión de cobertura de red de banda ancha**	**mié 15/01/20**	**dom 31/10/21**	**100%**	**Desarrollo Telemático**
84			Programar reuniones con las empresas de Telecomunicaciones a fin de conocer sus planes de crecimiento.	mié 15/01/20	dom 31/10/21	100%	Desarrollo Telemático
85		**1.2.5**	**Propiciar que en las nuevas obras de infraestructura carretera se considere la factibilidad de integrar red de fibra óptica**	**mar 28/01/20**	**vie 30/04/21**	**99%**	**Desarrollo Telemático**
86			Solicitar a SEIDUR integrar ductería en el nuevo libramiento	mar 28/01/20	mar 28/01/20	100%	Desarrollo Telemático

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
87			Exhorto a autoridades municipales para integrar ductería de fibra óptica en las remodelaciones o nuevas obras de vías de comunicación	jue 01/04/21	vie 30/04/21	100%	Desarrollo Telemático
88			Solicitar a SEIDUR el integrar ductería para fibra óptica en nuevas carreteras	mar 28/01/20	mar 18/02/20	100%	Desarrollo Telemático
89		**1.2.6**	**Actualizar la meta periódicamente con las definiciones que IFT pudiera llegar a publicar con respecto al servicio de banda ancha**	**mar 28/01/20**	**dom 31/10/21**	**100%**	**Desarrollo Telemático**
90			Solicitar a la IFT las características de un servicio para ser considerado de banda ancha	mar 28/01/20	vie 07/02/20	100%	Desarrollo Telemático
91			Revisar periodicamente en IFT las Metas establecidas de Cobertura de Banda Ancha	mar 28/01/20	dom 31/10/21	100%	Desarrollo Telemático
92			Publicar en el habilitador de acceso universal el servicio de banda ancha	mar 28/01/20	mar 31/03/20	100%	Desarrollo Telemático
93		**1.2.7**	**Realizar un diagnóstico sobre el Programa ARES y los pasos que deben darse para su adecuada explotación**	**jue 01/06/17**	**mar 30/11/21**	**4%**	**Desarrollo Telemático**
94			Firma de Convenios de Adhesión "ARES"	jue 01/06/17	mié 06/09/17	100%	Desarrollo Telemáti
95			Seguimiento a aprobación de la Ley de Asentamiento Humanos	mié 01/01/20	mar 30/11/21	0%	Desarrollo Telemático
96			Seguir impulsando la adhesión de los municipios	mié 01/01/20	mar 30/11/21	0%	Desarrollo Telemáti
97			Seguir impulsando la difusión a través de PROMTEL	mié 01/01/20	mar 30/11/21	0%	Desarrollo Telemático
98		**1.3**	**Ampliar las redes gratuitas de acceso a Internet e instalar más puntos de conexión, eficientes y seguros, en todos los municipios del estado**	**mié 01/01/20**	**dom 31/10/21**	**68%**	**Desarrollo Telemático**

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
99		**1.3.1**	**Fortalecer la Red Estatal de Educación, Salud y Gobierno del Estado**	**mié 01/01/20**	**mié 31/03/21**	**35%**	**Desarrollo Telemático**
100			Revisar estado jurídico de Asignaciones de frecuencias oficiales para la REESG	mié 01/04/20	lun 01/06/20	0%	Desarrollo Telemático
101			Dar seguimiento a solicitud de banda de frecuencia asignada para ultima Milla de la REESG	mié 01/01/20	jue 31/12/20	10%	Desarrollo Telemático
102			Conectividad 25 puntos de Educación con Colima-Conecta	mié 01/04/20	jue 31/12/20	100%	Desarrollo Telemático
103			Conectividad 18 puntos en Salud con Colima-Conecta	mar 06/10/20	mié 31/03/21	0%	Desarrollo Telemático
104		**1.3.2**	**Desarrollar, publicar y actualizar periódicamente el mapa de redes gratuitas de acceso a internet en espacios públicos**	**lun 22/02/21**	**mié 30/06/21**	**49%**	**Desarrollo Telemático**
105			Definir que información se publicará	lun 22/02/21	dom 28/02/21	100%	Desarrollo Telemáti
106			Implementación de software para publicación del mapa de sitios de internet gratuito en el micrositio de la ADC y la APP	lun 22/02/21	mié 30/06/21	46%	Desarrollo de Aplicaciones,Desarr Telemático
107		**1.3.3**	**Emprender campañas de concientización sobre el buen uso y cuidado de las TIC**	**mié 01/04/20**	**jue 31/12/20**	**0%**	**Desarrollo Telemático**
108			Elaborar un programa de capacitación sobre Ciberseguridad y buenas prácticas	mié 01/04/20	mar 30/06/20	0%	Desarrollo Telemático
109			Difundir Normativa sobre seguridad a usuarios	mar 01/09/20	jue 31/12/20	0%	Desarrollo Telemáti
110		**1.3.4**	**Garantizar el acceso seguro y la protección de datos personales en redes gratuitas públicas que ofrecen los programas de Gobierno**	**mié 01/07/20**	**dom 31/10/21**	**100%**	**Desarrollo Telemático**

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
111				Implementar un sistema de cifrado en las conexiones	mié 01/07/20	mar 15/12/20	100%	Desarrollo Telemático
112				Validar que las redes públicas y gratuitas que ofrezca el Gobierno del Estado garanticen el acceso seguro y la protección de Datos Personales.	lun 04/01/21	dom 31/10/21	100%	Desarrollo Telemático
113			**1.3.5**	**Priorizar la instalación de internet gratuito, en términos de localidades sin cobertura y población potencialmente usuaria**	**mié 01/04/20**	**jue 31/12/20**	**85%**	**Desarrollo Telemático**
114				Habilitar internet gratuito en 73 espacios públicos	mié 01/04/20	jue 31/12/20	100%	Desarrollo Telemáti
115				**Instalar 40 nuevos sitios de internet gratuito**	**mar 06/10/20**	**mié 23/12/20**	**68%**	**Desarrollo Telemát**
116				Solicitar a Salud los sitios propuestos para la instalación	mar 06/10/20	vie 11/12/20	100%	Desarrollo Telemático
117				Enviar a Telmex los sitios proporcionados por Salud	mar 06/10/20	vie 11/12/20	100%	Desarrollo Telemático
118				Revisión de instalación de sitios	mar 06/10/20	mié 23/12/20	0%	Desarrollo Telemáti
119				Implementar proceso de medición de satisfacción de usuarios del programa Colima Conecta	mié 11/11/20	mar 15/12/20	100%	Desarrollo Telemático
120			**1.3.6**	**Implementar un centro único de gestión y monitoreo de todos los puntos de acceso, de tal manera que exista información para maximizar el tiempo de funcionamiento**	**mié 01/07/20**	**mar 15/12/20**	**100%**	**Desarrollo Telemático**
121				Formalizar el NOC del ICSIC como el centro único de gestión y monitoreo de puntos de acceso a la red de Gobierno del Estado	mié 01/07/20	mar 15/12/20	100%	Desarrollo Telemático

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
122		**1.3.7**	**Asegurar la conectividad de todas las dependencias estatales y las -principales dependencias en cada municipio, de tal manera que se garantice la existencia de redes que podrán también ser utilizadas para la prestación tanto de internet en espacios públic**	**lun 27/04/20**	**dom 31/10/21**	**99%**	**Desarrollo Telemático**
123			Solicitar a servicios generales estado actual de proyecto de contaratación de conectividad para las dependencias de Gobierno del estado	lun 27/04/20	mar 30/06/20	100%	Desarrollo Telemático
124			Determinar si existen dependencias que aun no cuenten con existencia de red de datos y acceso a Internet	mié 01/07/20	mar 15/12/20	100%	Desarrollo Telemático
125			Asegurar la conectividad de la red estatal de Registro Civil	mar 01/12/20	dom 31/10/21	100%	Desarrollo Telemático
126			Instalará un enlace de fibra óptica dedicado para el servidor de RENAPO (interconexión)	mié 25/11/20	mié 01/09/21	100%	Desarrollo Telemático
127		**1.3.8**	**Impulsar programas, en asociación con las empresas de telecomunicaciones, para contribuir a la conectividad en espacios públicos**	**mié 01/07/20**	**mar 15/12/20**	**0%**	**Desarrollo Telemático**
128			Programar reuniones con las empresas de Telecomunicaciones a fin de conocer sus planes de creciemiento respecto a el ofrecimiento de Internet en espacios públicos.	mié 01/07/20	mar 15/12/20	0%	Desarrollo Telemático
129		**1.4**	**Implementar un modelo de seguridad informática**	**dom 01/01/17**	**vie 31/12/21**	**97%**	**Desarrollo Telemáti**

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completad	Nombres de los recursos
130		**1.4.1**	**Apoyar tecnologías que mejoren la confiabilidad de las comunicaciones y su integridad (como blockchain)**	**mié 01/07/20**	**jue 31/12/20**	**97%**	**Desarrollo Telemático**
131			Documentar al menos 2 procesos en materia de Seguridad Informática que cumplan con requerimientos técnicos de la norma ISO	mié 01/07/20	jue 31/12/20	100%	Desarrollo Telemático
132			Administracion de infraestructura de Cisco Hyperflex	jue 30/08/18	dom 31/10/21	100%	Desarrollo Telemático
133			Administracion de la Puerta de Enlace (Sonicwall)	dom 01/01/17	vie 31/12/21	100%	Desarrollo Telemáti
134			Administracion de infraestructura (conmutadores Cisco)	dom 04/02/18	dom 31/10/21	100%	Desarrollo Telemático
135			Elaborar, implementar al interior del ICSIC y publicar para las dependencias el Plan de Recuperación de Desastres (DRP)	mar 02/02/21	mié 30/06/21	0%	Desarrollo Telemático
136			**Economía Digital**	**mar 01/11/16**	**dom 31/10/21**	**46%**	**SEFOME**
137		**2**	**Promover la incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) al mundo digital desde una perspectiva integral**	**mar 01/11/16**	**dom 31/10/21**	**59%**	**SEFOME**
138		**2.1**	**Incrementar en un 25% las MiPyMEs usuarias de TIC para la gestión de su negocio**	**mar 01/11/16**	**dom 31/10/21**	**59%**	**SEFOME**
139		2.1.1	Realizar un diagnóstico del uso de TIC en las MiPyMEs colimenses	sáb 30/11/19	jue 30/09/21	0%	SEFOME
140		2.1.2	Implementar un programa de capacitación gerencial que promueva el uso y aprovechamiento de las TIC	jue 01/03/18	jue 30/09/21	100%	SEFOME

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
141		2.1.3	Capacitar a las MiPyMEs en los beneficios del uso de TIC, incluyendo la seguridad y protección de datos	jue 01/03/18	jue 30/09/21	100%	SEFOME
142		**2.1.4**	**Desarrollar trámites y servicios gubernamentales en línea para el sector empresarial**	**mar 01/11/16**	**dom 31/10/21**	**64%**	**SEFOME**
143			Portal SEFIDEC	mar 01/11/16	jue 15/12/16	100%	ICSIC
144			Solución de la e-firma incorporando los certificados del SAT	dom 15/01/17	lun 31/07/17	100%	ICSIC
145			Implementación e-Firma en Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	lun 17/09/18	lun 15/10/18	100%	ICSIC
146			Nuevo portal de proveedores	mar 01/01/19	lun 18/02/19	100%	ICSIC
147			Implementación de firma electrónica en el trámite de Avalúo Catastral del	mié 01/07/20	mar 15/12/20	100%	ICSIC / SEFOME
148			10 trámites en línea para apertura y operación de empresas	mar 02/02/21	dom 31/10/21	0%	ICSIC / SEFOME
149		2.1.5	Promover el uso de herramientas digitales para la interacción de las empresas con el gobierno	jue 30/08/18	lun 30/08/21	22%	SEFOME
150		2.1.6	Desarrollar un programa para facilitar la obtención de crédito para la implementación de tecnologías de información en los procesos productivos y prestación de servicios de las MiPyMEs	lun 02/03/20	lun 01/03/21	15%	SEFOME
151		2.1.7	Implementar esquemas de incentivos fiscales para MiPyMEs en proceso de digitalización	mié 01/07/20	mar 15/12/20	0%	SEFOME
152		2.1.8	Fortalecer y promover la cultura de la economía digital	vie 01/05/20	jue 30/09/21	100%	SEFOME

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
153		**2.1.9**	**Incentivar a las empresas dedicadas al desarrollo de tecnologías de la información**	**lun 03/06/19**	**mar 31/12/19**	**0%**	**SEFOME**
154			Generar 1 evento que impulsen el desarrollo del sector de tecnologías de la información	lun 03/06/19	lun 03/08/20	0%	ICSIC,SEFOME
155		**3**	**Impulsar la innovación tecnológica y la utilización de las TIC en las cadenas de producción de las MiPyMEs**	**mié 01/08/18**	**mar 01/09/20**	**25%**	**SEFOME**
156		**3.1**	**Implementar programas y acciones que detonen la innovación y el emprendimiento en las MIPyMES**	**mié 01/08/18**	**mar 01/09/20**	**40%**	**SEFOME**
157		3.1.1	Promover y vincular la formación de personal profesional y técnico en TIC para garantizar la existencia de talento en el mercado acorde a las vocaciones	mié 01/08/18	mar 01/09/20	0%	SEFOME
158		3.1.2	Fomentar la inversión en proyectos estratégicos de modernización y tecnificación basados en TIC	mié 01/08/18	mar 01/09/20	80%	SEFOME
159		**3.2**	**Posicionar al Tecnoparque CLQ como una de las cinco iniciativas más importantes en México que generan más proyectos de innovación y desarrollo**	**mié 01/08/18**	**mar 01/09/20**	**15%**	**SEFOME**
160		3.2.1	Consolidar al Tecnoparque CLQ e iniciativas similares como modelo promotor de innovación y desarrollo	mié 01/08/18	mar 01/09/20	45%	SEFOME
161		3.2.2	Instalar un punto de interconexión de internet (IXP) en el Tecnoparque CLQ	mié 01/08/18	mar 01/09/20	0%	SEFOME
162		3.2.3	Impulsar la articulación de la iniciativa privada, gobierno, academia, sociedad y medio ambiente para la implementación de una política pública que impulse la economía digital y desarrollo sostenible	mié 01/08/18	mar 01/09/20	0%	SEFOME

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
163			**4**	**Impulsar los principales sectores económicos colimenses a través del uso de las TIC: turismo, agroindustria y logística-portuaria**	**lun 01/04/19**	**dom 01/08/21**	**40%**	**SEFOME**
164			**4.1**	**Más del 95% de las empresas de los principales sectores económicos incorporan herramientas TIC en su gestión y prestación de sus servicios**	**lun 01/04/19**	**dom 01/08/21**	**40%**	**SEFOME**
165			4.1.1	Realizar un diagnóstico del uso de TIC en las empresas que trabajan en los principales sectores económicos colimenses	sáb 30/11/19	mié 15/04/20	0%	SEFOME
166			**4.1.2**	**Impulsar el uso de las TIC en la promoción e información turística local que incluya eventos, transporte, hospedaje y servicios**	**jue 29/10/20**	**vie 26/03/21**	**99%**	**SETUR**
167				Reunión inicial	jue 29/10/20	jue 05/11/20	100%	DDAD,ICSIC
168				Propuesta y aprobación de diseño	vie 13/11/20	vie 04/12/20	100%	DDAD
169				Desarrollo e implementación	lun 07/12/20	vie 26/03/21	100%	DDAD
170			4.1.3	Promover la industria turística a través de dispositivos móviles que contengan los atractivos turísticos más relevantes del Estado	mié 01/07/20	mié 31/03/21	100%	SETUR
171			4.1.4	Fortalecer la gestión del sector agroindustrial a través del uso de las TIC.	dom 05/01/20	dom 01/08/21	0%	SEDER,SEFOME
172			**4.1.5**	**Impulsar el desarrollo logístico portuario del Estado, incorporando tecnologías de información**	**lun 01/04/19**	**mié 30/06/21**	**99%**	**SEFOME**
173				Portal INVEST IN COLIMA	lun 01/04/19	vie 31/05/19	100%	Desarrollo de Aplica
174				Proyecto SEFOME	mar 01/09/20	mié 30/06/21	100%	SEFOME

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21



Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
175		4.1.6	Desarrollo e implementación del Atlas del Desarrollo Rural del Estado de Colima	mié 29/04/20	mar 15/12/20	0%	SEDER
176		4.1.7	Implementación de la plataforma de consulta al público sobre la vocación productiva del territorio en el Estado	mié 29/04/20	mar 15/12/20	0%	SEDER
177			**Gobierno Electrónico**	**lun 01/02/16**	**lun 31/10/22**	**78%**	**ICSIC**
178		**5**	**Modernizar la administración pública y modificar la interacción gobierno-ciudadano a través de la incorporación de TIC en la prestación de bienes y servicios públicos**	**lun 01/02/16**	**lun 31/10/22**	**79%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
179		**5.1**	**Integrar un ecosistema que contemple al menos cinco modelos de gestión gubernamental de gobierno electrónico**	**lun 15/02/16**	**vie 31/12/21**	**79%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
180		**5.1.1**	**Implementar la Ventanilla Única Estatal de trámites y servicios electrónicos que integre los trámites más demandados por la ciudadanía**	**mar 03/01/17**	**mar 30/06/20**	**99%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
181			Portal de Trámites y Servicios de Gobierno del Estado	mar 03/01/17	mié 31/05/17	100%	DDAD
182			**Homologar el front end, en la realización de trámites en línea**	**mar 04/02/20**	**mar 30/06/20**	**99%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
183			Concluir análisis	mar 04/02/20	lun 20/04/20	100%	DDAD
184			Desarrollo	mar 21/04/20	vie 05/06/20	100%	DDAD
185			**Implementación y Pruebas**	**dom 16/02/20**	**mar 30/06/20**	**99%**	**DDAD**
186			Actas del Registro Civil	lun 08/06/20	mar 30/06/20	100%	DDAD

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
187			No Antecedentes, No Inhabilitación, No Propiedad	dom 16/02/20	mar 31/03/20	100%	DDAD
188			**Implementar la App**	**mié 02/01/19**	**mar 03/09/19**	**100%**	**Desarrollo de Aplica**
189			Desarrollo e Implementación	mié 02/01/19	mar 03/09/19	100%	DDAD
190		**5.1.2**	**Implementar el Expediente para Trámites y Servicios Electrónicos**	**mié 06/03/19**	**mié 30/06/21**	**8%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
191		**G1902**	**Consulta electrónica de documentos que emite Gobierno del Estado (Iniciando con actas de RC)**	**mié 06/03/19**	**mié 30/06/21**	**8%**	**Desarrollo de Aplicaciones,Coordi**
192			**Portal ciudadano**	**lun 20/04/20**	**mié 30/06/21**	**0%**	**Desarrollo de Aplica**
193			Análisis	lun 20/04/20	vie 31/07/20	0%	DDAD
194			Desarrollo	lun 03/08/20	mié 30/06/21	0%	DDAD
195			**Portal dependencia**	**lun 20/04/20**	**mié 30/06/21**	**0%**	**Desarrollo de Aplica**
196			Análisis	lun 20/04/20	vie 31/07/20	0%	DDAD
197			Desarrollo	lun 03/08/20	mié 30/06/21	0%	DDAD
198			**Hacer la api, para la consulta certificada de documentos , acta de nacimiento, No antecedentes y no inhabilitación**	**mié 06/03/19**	**lun 13/07/20**	**99%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
199			Análisis	mié 06/03/19	vie 22/03/19	100%	DDAD
200			Desarrollo	lun 25/03/19	mar 30/04/19	100%	DDAD
201			Mejora en el flujo de la API a través del consumo del cliente (WebAPI SIRCBI)	lun 29/06/20	lun 13/07/20	100%	DDAD
202		**5.1.3**	**Implementar el Portal Único del Gobierno del Estado de Colima**	**vie 14/10/16**	**vie 31/07/20**	**99%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
203			Desarrollo del portal	vie 14/10/16	vie 30/03/18	100%	Desarrollo de Aplica

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		

Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
204			17 dependencias	vie 30/03/18	jue 20/12/18	100%	DDAD
205			34 organismos	vie 30/03/18	jue 20/12/18	100%	DDAD
206			Analizar tendencias de los portales	lun 06/07/20	vie 24/07/20	100%	DDAD
207			Implementar el certificado de seguridad del Portal	lun 13/01/20	vie 31/07/20	100%	DDAD
208		**5.1.4**	**Construir un sistema basado en individuos que fortalezca el Registro Civil en el Estado**	**mar 01/03/16**	**dom 31/10/21**	**97%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
209		G1902	Anexo de Transferencia para la Modernización del RC	mar 01/03/16	dom 31/10/21	94%	Coordinación Técnica
210			**Desarrollo e Implementación del SIRCBI**	**dom 01/04/18**	**jue 31/12/20**	**99%**	**DDAD**
211			Desarrollo	dom 01/04/18	mar 07/01/20	100%	DDAD
212			Implementación	mié 02/01/19	jue 31/12/20	99%	DDAD
213			Implementación en Municipios	mié 02/01/19	mar 31/12/19	100%	DDAD
214			Garantizar la conectividad entre Oficialías y Dirección	jue 02/01/20	mié 30/09/20	100%	Coordinación Técnica,Desarrollo
215			Implementar el SIRCBI (resto de las Oficialías)	lun 03/02/20	vie 17/07/20	100%	DDAD
216			Garantizar la integridad de la información	mar 07/01/20	jue 31/12/20	100%	Oficialías,DDAD
217		**5.1.5**	**Implementar el expediente electrónico clínico local con los más altos estándares de protección de información personal**	**mar 01/03/16**	**mar 15/12/20**	**84%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
218			Acreditar porcentaje en el PED, desglosando las tareas que se reportan en el mismo	mar 01/03/16	lun 31/12/18	100%	Salud

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
219				A través de la comisión de Infraestructura Informática determinar la cobertura de Internet para los Centros de Salud	lun 01/06/20	mar 30/06/20	0%	Salud
220				Plan de trabajo de Implementación	mié 01/07/20	mar 15/12/20	0%	Salud
221			**5.1.6**	**Construir un modelo que permita transitar a un gobierno sin papel**	**lun 14/01/19**	**jue 31/12/20**	**80%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
222			**G1902**	**Modernización del modelo de firma electrónica**	**lun 14/01/19**	**vie 31/07/20**	**96%**	**Desarrollo de Aplica**
223				Capacitación por parte del proveedor	lun 14/01/19	jue 17/01/19	100%	DDAD
224				Investigación	lun 21/01/19	mar 30/04/19	100%	DDAD
225				Análisis	lun 01/06/20	vie 17/07/20	100%	DDAD
226				Desarrollo	mar 17/09/19	vie 24/07/20	100%	DDAD
227				Pruebas e Implementación	mié 15/07/20	vie 31/07/20	0%	Calidad
228			**G1903**	**Gestión de Documentos con Firma Electrónica (Oficios digital con firma electrónica)**	**mié 27/03/19**	**jue 31/12/20**	**55%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
229			1	Desarrollo del sistema	mié 27/03/19	vie 13/12/19	100%	DDAD
230			**2**	**Prueba piloto**	**vie 31/01/20**	**vie 31/07/20**	**29%**	**Desarrollo de Aplica**
231				Validar con las dependencias los trámites que puedan integrarse a la plataforma de oficios con firma electrónica	vie 31/01/20	vie 28/02/20	100%	DT / ICSIC
232				Elaborar un plan de implementación en los trámites definidos	vie 31/01/20	vie 31/07/20	7%	DT / ICSIC
233				Revisar lineamientos	mié 05/02/20	mié 05/02/20	100%	Dirección de Tecnol
234				Oficializar y difundir lineamientos	mié 05/02/20	vie 28/02/20	0%	DCGP

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id		Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
235				Reunión informativa del plan de implementación a Directores: convoca SP (SAGP)	mar 18/02/20	mar 18/02/20	0%	ICSIC-Calidad SAGP
236				Convocar a capacitación	vie 31/01/20	vie 31/01/20	100%	Dirección de Tecnol
237				Capacitación a los generadores de documentos	jue 06/02/20	jue 06/02/20	100%	ICSIC
238				Capacitación a generadores de documentos de las diferentes áreas con las que se inica el proyecto	mar 11/02/20	mar 11/02/20	100%	DDAD
239				Identificar los firmantes de los trámites seleccionados y si cuentan con su e-firma	jue 06/02/20	jue 06/02/20	100%	Dirección de Tecnologías
240				Implementar prueba piloto	lun 01/06/20	vie 31/07/20	0%	DDAD-DT
241			**3**	**Implementación en dependencias centralizadas del Ejecutivo**	**sáb 01/08/20**	**jue 31/12/20**	**0%**	**DDAD**
242			G1903	Sistema de becas rurales - SEDESCOL	mar 12/03/19	sáb 15/06/19	100%	Desarrollo de Aplica
243			**G1904**	**Generación de recibos de nómina**	**jue 04/04/19**	**vie 13/03/20**	**99%**	**Desarrollo de Aplic**
244				Desarrollo	jue 04/04/19	lun 03/06/19	100%	DDAD
245				Implementación recibos de nómina para todo Gobierno	lun 01/07/19	mié 28/08/19	100%	Desarrollo de Aplicaciones
246				Magisterio	lun 03/06/19	mié 31/07/19	100%	DDAD
247				Burocracia	mié 18/12/19	mié 15/01/20	100%	DDAD
248				Difusión	lun 03/02/20	vie 13/03/20	100%	Trámites y Servicios

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completad	Nombres de los recursos
249		**5.1.7**	**Colaborar en materia tecnológica y de asesoría con los municipios del estado para impulsar la implementación de servicios y trámites municipales electrónicos**	**lun 15/02/16**	**vie 31/12/21**	**96%**	**Coordinación Técnica**
250			Implementación del SIRCBI para usuarios de Oficialías Titulares y Auxiliares del Registro Civil de los Ayuntamientos	mié 02/01/19	dom 15/12/19	100%	DDAD
251			**Equipamiento de los 10 Ayuntamientos**	**jue 07/07/16**	**vie 31/12/21**	**90%**	**DDAD**
252			Equipamiento de ayuntamientos a través de Anexo de Transferencia 2016	jue 07/07/16	sáb 31/12/16	100%	DDAD
253			Equipamiento de ayuntamientos a través de Anexo de Transferencia 2017	vie 07/07/17	dom 31/12/17	100%	DDAD
254			Equipamiento de ayuntamientos a través de Anexo de Transferencia 2018	sáb 07/07/18	lun 31/12/18	100%	DDAD
255			Equipamiento de ayuntamientos a través de Anexo de Transferencia 2019	dom 07/07/19	mar 31/12/19	100%	DDAD
256			Equipamiento de ayuntamientos a través de Anexo de Transferencia 2021	mié 07/07/21	vie 31/12/21	50%	DDAD
257			**Implementación de la Firma Electrónica en los trámites de los Ayuntamientos**	**jue 17/10/19**	**mar 22/10/19**	**100%**	**DDAD**
258			Colima	jue 17/10/19	mar 22/10/19	100%	DDAD
259			Asesoría a los Ayuntamientos en los trámites en línea de Licencia de Funcionamiento y Licencia de Construcción	lun 15/02/16	lun 16/07/18	100%	DDAD

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

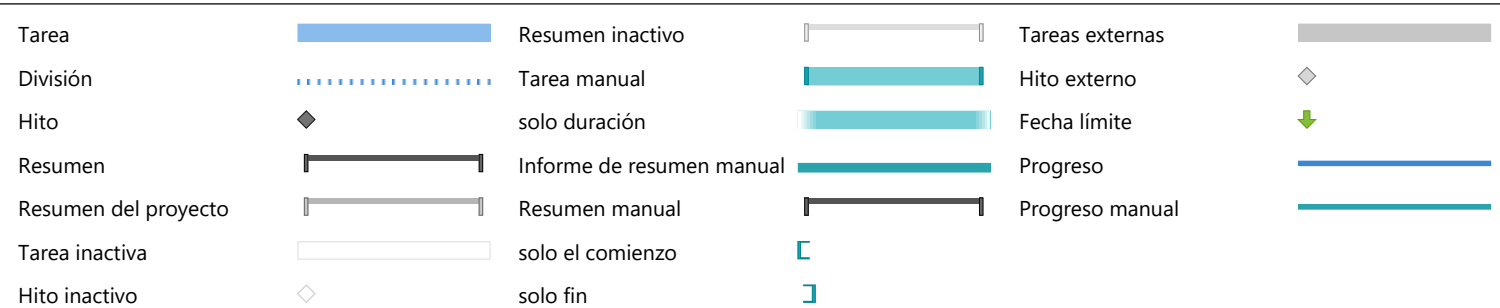


Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
260		**5.1.8**	**Integrar un modelo del Registro del Territorio, que defina la política pública en el uso de TIC en esta área**	**jue 13/02/20**	**mar 15/12/20**	**100%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
261			Analizar los documentos enviados por el IRTEC	jue 13/02/20	vie 21/02/20	100%	DDAD
262			Seguimiento modelo	lun 24/02/20	mar 15/12/20	100%	Coordinación Técnic
263		**5.1.9**	**Implementar un sistema interoperable único de identidad que permita identificar al usuario con una sola cuenta en las diferentes plataformas gubernamentales**	**mar 01/09/20**	**lun 15/03/21**	**0%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
264			Herramienta de diagnóstico de logueo de los sistemas de la Secretaría de Administración, para obtener las características de cada uno	mar 01/09/20	lun 15/03/21	0%	DTI / DDAD
265			Diagnóstico de logueo de los sistemas de la Secretaría de Administración	mar 01/09/20	lun 15/03/21	0%	DTI / DDAD
266			Definición del modelo de logueo para las partes administrativas de los sistemas.	mar 01/09/20	lun 15/03/21	0%	DDAD
267			Desarrollo del modelo de logueo	mar 01/09/20	lun 15/03/21	0%	DDAD
268			Publicar los lineamientos para observación por parte de las dependencias del Ejecutivo	mar 01/09/20	lun 15/03/21	0%	DTI / DDAD
269			Implementar el modelo de logueo en los trámites de la Secretaría de Administración	mar 01/09/20	lun 15/03/21	0%	DTI / DDAD
270		**5.1.10**	**Desarrollar e implementar lineamientos y políticas en materia de Gobierno Electrónico**	**lun 21/08/17**	**jue 30/04/20**	**77%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
271			Implementar el procedimiento de Incorporación de trámites o servicios en línea al Portal Único de Gobierno del Estado, en coordinación con SEFOME	mié 15/01/20	mar 31/03/20	100%	Coordinación Técnica,Dirección General

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

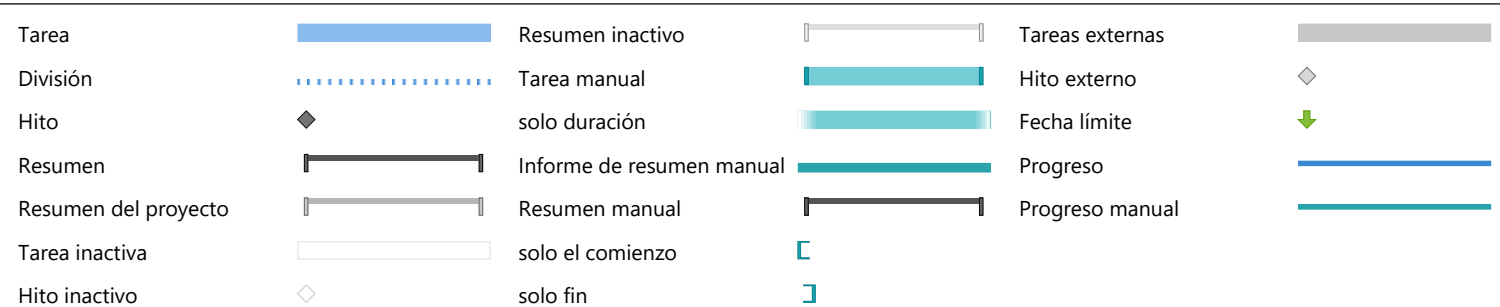


Id		Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
272				Guía de estilos Portal Único	lun 21/08/17	mié 29/11/17	100%	DDAD
273				Guía de estilos del front end de los trámites en línea	lun 09/03/20	jue 30/04/20	0%	DDAD
274			**5.2**	**Más de la mitad de los accesos a los servicios y pagos más utilizados haya sido a través de alguna plataforma digital**	**lun 01/02/16**	**lun 31/10/22**	**80%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
275			**5.2.1**	**Promover el uso de la Firma Electrónica en todo el ámbito público**	**mié 22/08/18**	**dom 31/10/21**	**99%**	**Desarrollo de Aplicaciones,Coordi**
276				Ofertar el uso de firma electrónica para que sea implementada en los procesos del Poder Legislativo	mié 22/08/18	dom 15/12/19	100%	Coordinación Técnica,Dirección General
277				Ofertar el uso de firma electrónica para que sea implementada en los procesos del Poder Judicial	mié 22/08/18	dom 15/12/19	99%	Coordinación Técnica,Desarrollo
278				Seguimiento	mié 22/08/18	dom 15/12/19	100%	Coordinación Técnic
279				Capacitación	lun 04/03/19	lun 04/03/19	100%	DDAD
280				Implementación de firma electrónica en el Ayuntamiento de Colima	jue 17/10/19	mar 22/10/19	100%	Coordinación Técnica,Desarrollo
281				Convenio de colaboración OSAFIG	mié 06/05/20	vie 05/06/20	100%	Dirección General,T
282				Convenios (Archivo Municipal Colima, UdeC)	mié 06/01/21	dom 31/10/21	100%	Dirección General,T
283			**5.2.2**	**Garantizar que todos los pagos estatales puedan hacerse en línea**	**vie 31/01/20**	**mar 15/12/20**	**6%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
284				Revisar que existan todos los pagos de impuestos y derechos en línea	vie 31/01/20	vie 31/01/20	100%	Ingresos
285				Vincular RETyS con las claves de ingresos que les correspondan	vie 31/01/20	mar 31/03/20	30%	Ingresos,DDAD

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

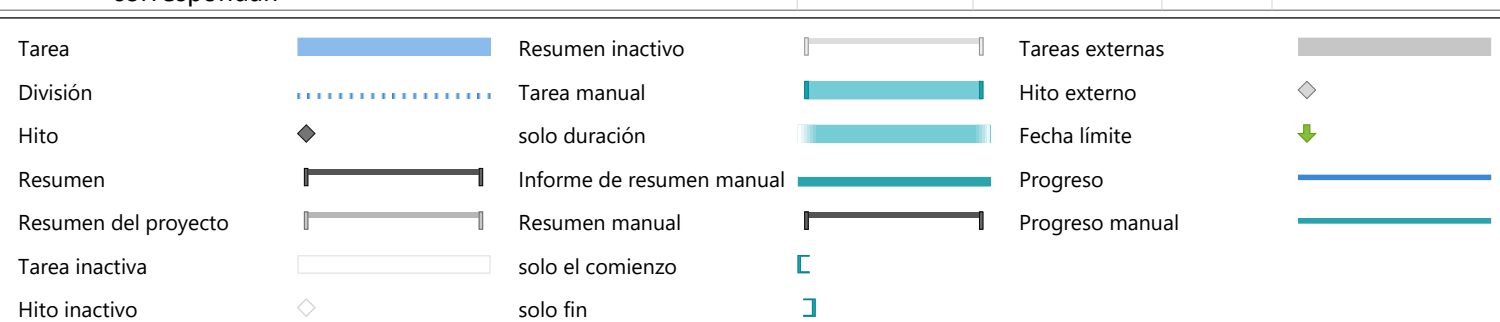


Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
286			Generar el aplicativo para la acreditación de pagos	jue 12/03/20	mar 30/06/20	0%	Ingresos
287			Implementar el pago en línea por dependencias	mié 01/07/20	mar 15/12/20	0%	SEFOME/ICSIC/Ingre
288		**5.2.3**	**Incentivar y promover el uso de trámites y servicios gubernamentales en línea**	**lun 02/07/18**	**dom 31/10/21**	**58%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
289			Gestionar que los costos de los trámites en línea sean más bajos	jue 12/03/20	vie 15/05/20	100%	Dirección General
290			Promover en medios el uso de trámites y servicios en línea	jue 12/03/20	dom 31/10/21	100%	ICSIC/Dirección de Trámites y
291			Hacer uso del RETyS para dar detalle de información de la clave de ingresos	mié 01/07/20	mar 15/12/20	0%	Ingresos
292			**Vinculación del RETyS con la página de pagos de la SPyF**	**jue 12/03/20**	**mar 15/12/20**	**0%**	**ICSIC / DGI**
293			Implementar en las dependencias el proceso para la entrega del producto o servicio una vez que se paga desde página de SPyF	mié 01/07/20	mar 15/12/20	0%	SEFOME/ICSIC/Ingre
294			Vincular desde la página de pagos de la SPyF los trámites en línea, eliminando la posibilidad de hacer solo el pago	jue 12/03/20	vie 29/05/20	0%	Ingresos
295			Evaluar la posibilidad de pagar en línea desde el extranjero	vie 31/01/20	vie 31/01/20	100%	Ingresos
296			Sistema de estadísticas de trámites y servicios en línea: enviar documentación del ws para su análisis	vie 31/01/20	vie 31/01/20	50%	ICSIC
297		G1902	Sistema de estadísticas de trámites y servicios en línea	lun 02/07/18	jue 12/09/19	50%	Desarrollo de Aplicaciones

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

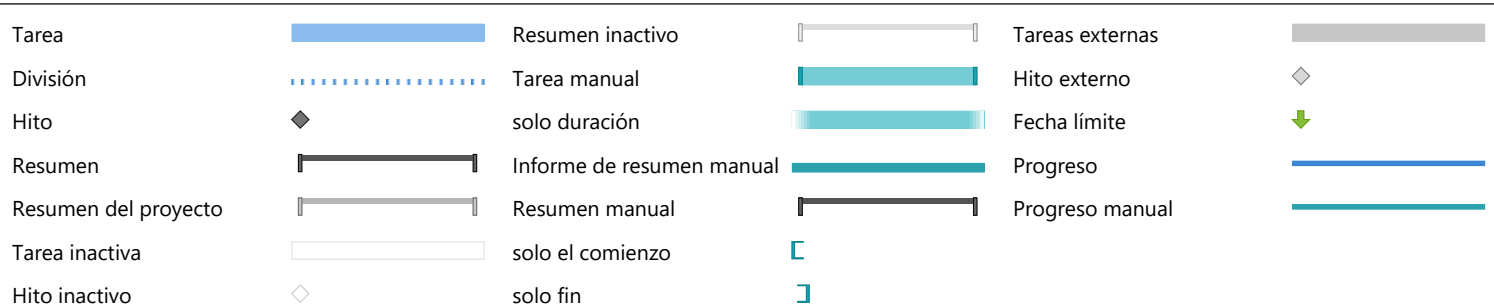


Id		Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completad	Nombres de los recursos
298			**5.2.4**	**Asistir a la ciudadanía, a través de la Mesa de Ayuda, en los trámites y servicios gubernamentales en línea**	**lun 01/02/16**	**lun 31/10/22**	**96%**	**Trámites y Servicios**
299				**Implementar un mecanismo de comunicación con el usuario para que se le pueda orientar y resolver sus dudas al momento de realizar su trámite, directamente en la plataforma.**	**lun 01/02/16**	**lun 31/10/22**	**96%**	**Trámites y Servicios**
300				Documentar e implementar procedimiento de mesa de ayuda.	jue 06/06/19	mié 18/12/19	100%	Trámites y Servicios
301				Publicar un video tutorial y/o guía de cada trámite	jue 21/01/21	jue 30/09/21	50%	Trámites y Servicios
302				Asesorar y asistir a la ciudadanía en los trámites y servicios en línea	lun 01/02/16	lun 31/10/22	100%	Trámites y Servicios
303			**5.2.5**	**Implementar pagos y servicios estatales a través de tiendas de conveniencia**	**mié 01/01/20**	**mar 30/06/20**	**99%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
304				Ya se encuentra concluida. Detallar: Nombre del proyecto, periodo en que se implementó e impacto	mié 01/01/20	mar 30/06/20	100%	Ingresos
305				Generar ficha informativa del proyecto. Se anexa ejemplo	lun 30/03/20	lun 20/04/20	100%	Ingresos
306			**5.2.6**	**Acercar los trámites y servicios gubernamentales a la población a través de kioscos electrónicos**	**mar 01/03/16**	**vie 15/10/21**	**75%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
307				Identificar nuevos kioscos instalados en esta administración y si se tiene planeado abrir más	mar 01/03/16	mar 15/12/20	100%	Ingresos
308				Identificar nuevos trámites en línea para ofrecer en kioscos	dom 01/03/20	jue 30/04/20	0%	ICSIC

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

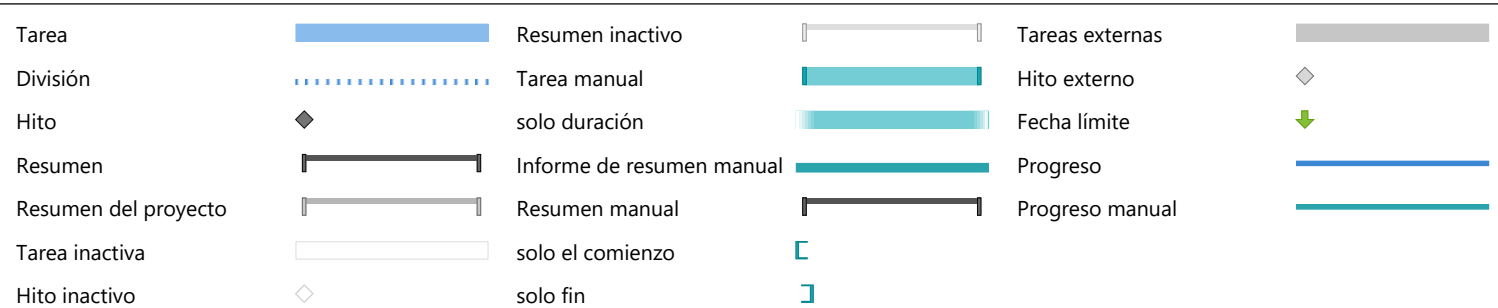

Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
309			Implementar nuevos trámites en línea	lun 04/05/20	vie 15/10/21	0%	DDAD
310		**5.2.7**	**Publicar en los portales digitales la lista de requisitos y montos de pago para trámites públicos**	**dom 01/01/17**	**vie 29/05/20**	**100%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
311			**RETyS**	**dom 01/01/17**	**vie 29/05/20**	**100%**	**Coordinación Técni**
312			RETyS	dom 01/01/17	mar 31/07/18	100%	SEFOME
313			Homologar el RETyS con las claves de ingresos	vie 31/01/20	mar 31/03/20	100%	ICSIC / SEFOME
314			Implementar WS de ingresos para obtener el costo en el RETyS	jue 12/03/20	vie 29/05/20	100%	DDAD
315		**5.2.8**	**Dar seguridad en las transacciones electrónicas que realiza la población con gobierno para propiciar su adopción**	**mié 29/04/20**	**dom 31/10/21**	**60%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
316			Mejorar motor de pagos en los trámites en línea	mié 29/04/20	mar 15/12/20	0%	Ingresos
317			Implementación del certificado de seguridad en el portal, principalmente en los trámites que se pagan	mié 29/04/20	mar 15/12/20	100%	DDAD
318			Renovación del certificado	lun 03/08/20	dom 31/10/21	100%	DDAD,Desarrollo Te
319			Fortalecer la seguridad del sitio de pagos	mié 29/04/20	mar 15/12/20	0%	DDAD/DI
320		**6**	**Implementar un modelo que impulse la transparencia proactiva en las compras gubernamentales**	**lun 04/03/19**	**mar 31/08/21**	**43%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
321		**6.1**	**La mitad de las contrataciones públicas anuales se realizarán mediante una Plataforma Digital Única**	**lun 04/03/19**	**mar 31/08/21**	**43%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
322		**6.1.1**	**Generar un Sistema Electrónico de Compras Públicas**	**lun 04/03/19**	**mar 28/01/20**	**100%**	**Desarrollo de Aplic**
323		G1901	Sistema Estatal de Compras Públicas (SECOP)	vie 24/01/20	mar 28/01/20	100%	Desarrollo de Aplica

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

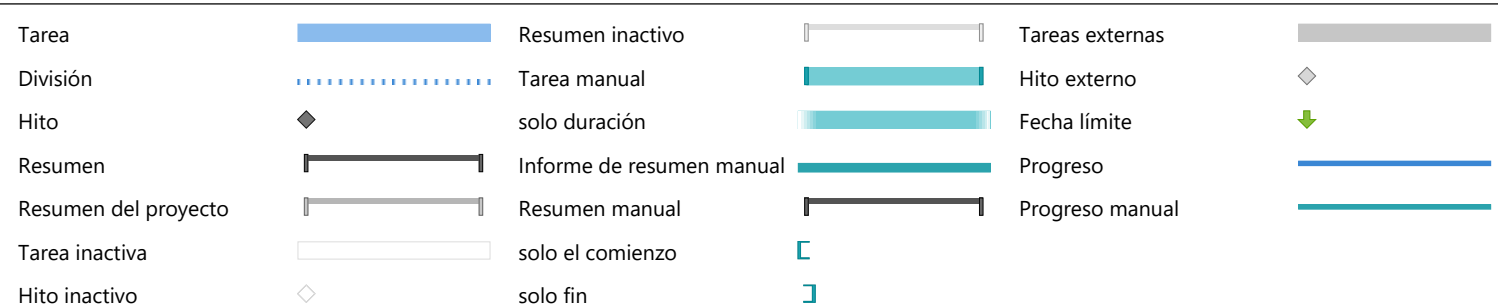

Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
324			Redireccionar la liga de SECOP desde el portal único	vie 24/01/20	mar 28/01/20	100%	Dirección de Tecnologías / ICSIC
325			Generar un acceso para consultar el histórico del SECOP anterior al 2020	lun 27/01/20	lun 27/01/20	100%	ICSIC
326			Validar con la Dirección de Adquisiciones quién captura la información de Testigos Sociales	mar 28/01/20	mar 28/01/20	100%	Dirección de Tecnologías
327			Publicar nueva versión de SECOP y portal de Proveedores	mar 28/01/20	mar 28/01/20	100%	ICSIC
328		G1901	Sistema Administrador de SECOP	lun 04/03/19	vie 17/01/20	100%	Desarrollo de Aplica
329		**6.1.2**	**Impulsar un modelo de contrataciones abiertas públicas basado en el uso y aprovechamiento de TIC**	**lun 22/06/20**	**mar 31/08/21**	**0%**	**Desarrollo de Aplicaciones**
330			Análisis de los datos que maneja Gobierno contra el estándar de Contrataciones Abiertas	lun 22/06/20	vie 31/07/20	0%	DDAD
331			Elaborar propuesta	lun 03/08/20	lun 31/08/20	0%	DDAD
332			Presentar propuesta a la Dirección de Adquisiciones	lun 07/09/20	vie 11/09/20	0%	DDAD
333			Desarrollo de Propuesta	vie 11/09/20	mar 31/08/21	0%	Desarrollo de Aplica
334			**e-Educación**	**mar 01/01/19**	**vie 31/12/21**	**37%**	**SE**
335		**7**	**Utilizar las TIC como instrumentos de formación, capacitación y actualización de docentes, directivos y personal de apoyo técnico-pedagógico de educación básica, educación media y superior, así como un medio para promover la educación continua de la pobla**	**mar 01/01/19**	**vie 31/12/21**	**42%**	**SE**

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id		Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
336			**7.1**	**Todo el personal docente, directores y técnico-pedagógico deberá estar capacitado en la utilización de TIC**	**mar 01/01/19**	**vie 31/12/21**	**77%**	**SE**
337			**7.1.1**	**Crear y actualizar los programas de formación, capacitación y actualización para incorporar la educación en TIC**	**dom 01/09/19**	**mar 01/12/20**	**99%**	**SE**
338				Diseño de una oferta de capacitación dirigida a docentes, directivos y asesores técnico pedagógico que considere temáticas que promuevan las Habilidades Digitales	mar 01/10/19	mar 01/12/20	100%	SE
339				Realización un Diagnóstico sobre las necesidades de capacitación dirigida a docentes de educación básica.	mar 01/10/19	jue 31/10/19	100%	SE
340				Publicación de la Convocatoria de la Oferta Académica de Formación Continua de Curso 2020.	sáb 01/02/20	jue 20/02/20	100%	SE
341				Impartición de cursos de acuerdo a la Oferta Académica de Formación Continua de Curso 2020.	sáb 01/02/20	mar 30/06/20	100%	SE
342				Promover las diferentes plataformas educativas que ofertan cursos y diplomados en el uso de las TIC a través de la página de la Secretaría de Educación.	dom 01/09/19	jue 30/07/20	100%	SE
343				Invitar vía correo electrónico a docentes de educación básica a participar en el diplomado “Habilidades Digitales Docentes para el siglo XXI “	lun 04/11/19	vie 15/11/19	100%	SE

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
344			Invitar vía correo electrónico a docentes de educación básica a participar en el los cursos: 1) TIC e Innovación básico. 2) Aprende Wordpress	mié 01/01/20	sáb 01/02/20	100%	SE
345		**7.1.2**	**Promover la Certificación en competencias digitales para maestros docentes con valor curricular o escalafonario**	**jue 01/08/19**	**jue 31/12/20**	**99%**	**SE**
346			Capacitación y Certificación: Google Educator Nivel I dirigido a Supervisores, Directores, Docentes	lun 10/02/20	vie 14/02/20	100%	SE
347			Informar en la página de la Secretaria de Educación los diferentes Programas de Certificación en Competencias Digitales dirigidos a los Docentes de educación Básica.	jue 01/08/19	jue 31/12/20	100%	SE
348		**7.1.3**	**Aumentar la eficiencia del sistema de administración escolar a través de portales en línea en todos los niveles educativos**	**mar 01/01/19**	**vie 31/12/21**	**99%**	**SE**
349			Crear los recursos y herramientas en la plataforma de la Secretaría de Educación que contribuyan a la mejora del servicio administrativo escolar.	mar 01/01/19	vie 31/12/21	100%	SE
350			Implementar el proyecto “Mi correo Institucional” dirigido a todo el personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación.	mié 01/01/20	mar 31/08/21	100%	SE
351			Implentar el proyecto "Módulo Electrónico de Titulación" dirigido a Universidades particulares adscritas a la Secretaría de Educación.	mié 01/01/20	jue 31/12/20	100%	SE

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

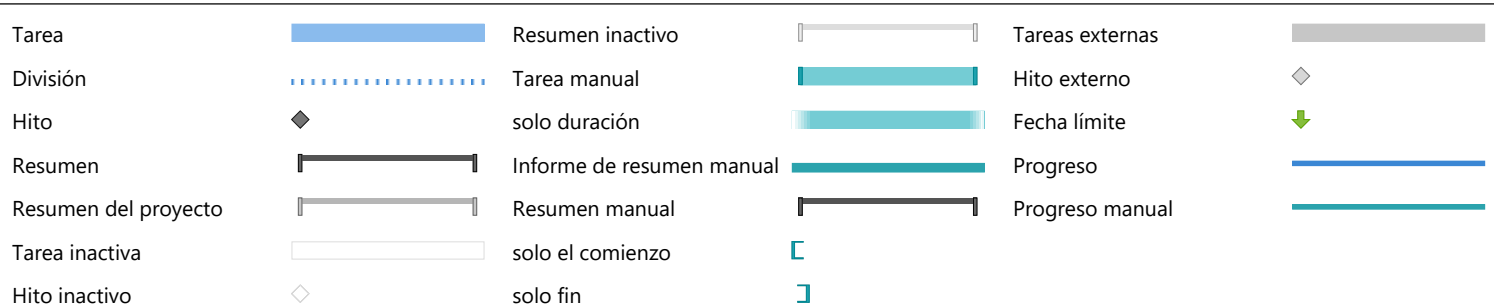

Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
352		**7.1.4**	**Promover la creación de un Centro Tecnológico Educativo con laboratorios que estimulen la educación en TIC para acceso de la comunidad escolar que incluye a docentes, alumnado y padres de familia**	**lun 13/01/20**	**lun 30/08/21**	**0%**	**SE**
353			Elaborar convenios de colaboración con empresas privadas para la creación de un Centro Tecnológico Educativo, así como el apoyo de Instituciones Educativas de nivel superior para la creación y operación del mismo.	lun 13/01/20	lun 30/08/21	0%	SE
354		**7.1.5**	**Establecer y ejecutar convenios de colaboración entre la Universidad de Colima, Tecnológico de Colima y otras instituciones, para generar programas de capacitación que fomenten el desarrollo de las Competencias Digitales en los docentes de educación básica**	**dom 30/08/20**	**vie 29/10/21**	**0%**	**SE**
355			Generar un catálogo de cursos que considere temáticas en el uso de las TIC que puedan ofertarse a los docentes de educación básica, educación media y superior para el ciclo escolar 2020-2021	lun 30/11/20	vie 29/01/21	0%	SE

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completad	Nombres de los recursos
356			Elaborar convenios de colaboración entre la Secretaría de Educación-Universidad de Colima-Tecnológico Regional-Universidades Particulares con el fin de generar acciones que fomenten el desarrollo de Competencias Digitales en los docentes de educación básica	dom 30/08/20	vie 29/10/21	0%	SE
357		**7.2**	**Incrementar en al menos un 25% la incorporación de herramientas tecnológicas en los modelos de enseñanza de las escuelas de todos los niveles**	**lun 02/09/19**	**dom 31/10/21**	**28%**	**SE**
358		**7.2.1**	**Actualizar y acrecentar la infraestructura tecnológica existente en las distintas áreas de las instituciones (planteles educativos, edificios administrativos y oficinas centrales)**	**lun 02/09/19**	**dom 31/10/21**	**13%**	**SE**
359			Realizar convenios de equipamiento tecnológico con la iniciativa privada.	mié 30/09/20	vie 29/10/21	0%	SE
360			Dotar de tecnología a los planteles educativos de educación básica, considerando los diferentes tipos de equipamiento (federal-estatal).	lun 02/09/19	vie 30/10/20	30%	SE
361			Equipar las oficinas centrales y edificios administrativos de la CSEEC.	mié 01/07/20	dom 31/10/21	10%	SE
362		**7.2.2**	**Desarrollar aplicaciones (“apps”) que ayuden al estudiante colimense a prepararse académicamente de cara a evaluaciones (desde pruebas educativas ordinarias y extraordinarias hasta preparación de exámenes de ingreso a los distintos niveles educativos)**	**mié 01/07/20**	**dom 31/10/21**	**0%**	**SE**

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
363			Elaborar proyectos para el diseño de “apps” en carreras universitarias afines a las TIC que aborden ejercicios de evaluaciones de los contenidos abordados en los niveles de educación media superior y superior.	mié 01/07/20	dom 31/10/21	0%	SE
364			Implementar Concursos de elaboración de “app” con temáticas de las diferentes asignaturas que se imparten en el nivel medio superior.	mié 01/07/20	dom 31/10/21	0%	SE
365		**7.2.3**	**Incrementar el número de planteles educativos con acceso a Internet efectivo y de calidad**	**mié 01/07/20**	**vie 29/10/21**	**99%**	**SE**
366			Diseñar proyectos de conectividad con el fin de proporcionar servicios de internet con calidad y efectividad para incorporar nuevos planteles educativos.	mié 01/07/20	vie 29/10/21	100%	SE
367			Revisar la conectividad existente en los planteles educativos de manera permanente.	mié 01/07/20	vie 29/10/21	100%	SE
368		7.2.4	Crear centros de cómputo gratuitos y puntos de conexión en zonas de alta densidad de estudiantes	mié 01/07/20	dom 31/10/21	0%	SE
369		7.2.5	Promover la capacitación para la generación y elaboración de secuencias y material didáctico que incorporen el uso de TIC para todos los niveles educativos y de acuerdo con los Programas de estudio vigentes	mié 01/07/20	dom 31/10/21	20%	SE
370		7.2.6	Crear aulas virtuales donde docentes y alumnos convivan, a manera de red social, en materia educativa	mié 01/07/20	dom 31/10/21	100%	SE

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

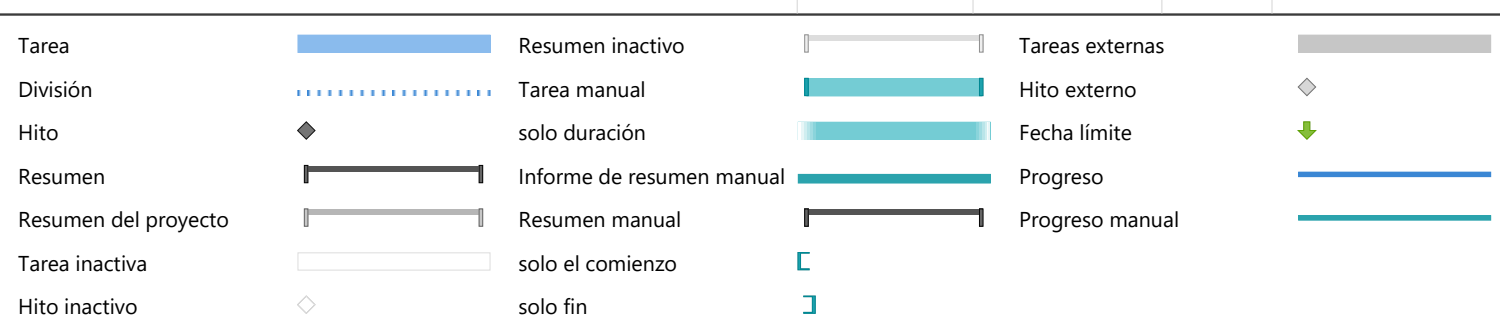

Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
371		7.2.7	Promover la participación de la iniciativa privada en la aportación de herramientas tecnológicas a los planteles educativos	mié 01/07/20	dom 31/10/21	0%	SE
372		7.2.8	Involucrar escuelas técnicas y superiores para que apoyen en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de TIC en los planteles del sector educativo	mié 01/07/20	dom 31/10/21	0%	SE
373		7.2.9	Implementar modelos y/o contenidos para el desarrollo de habilidades STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en educación básica	mié 01/07/20	dom 31/10/21	0%	SE
374		**7.3**	**Diseñar un ecosistema de educación en línea que permita abatir la brecha educativa, el rezago educativo y la deserción escolar, así como complementar la docencia presencial y promover la educación continua, técnica y extracurricular**	**lun 02/03/20**	**vie 12/11/21**	**12%**	**SE**
375		7.3.1	Desarrollar un banco de datos, biblioteca y repositorio digital para docentes y alumnos	mié 01/07/20	mar 15/12/20	0%	SE
376		**7.3.2**	**Producir contenidos que contribuyan a expandir la educación y llevarla fuera de los límites del sistema formal y con ello, impulsar la inclusión de la sociedad de la información y el conocimiento**	**lun 02/03/20**	**vie 12/11/21**	**0%**	**SE**

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
377			Difundir el uso del Portal Aprende y de la Plataforma, ambos propiedad de la FCS y visibles en los siguientes links: https://aprende.org/ y https://capacitateparaelempleo.org/, respectivamente, entre la población buscadora de empleo que se atiende en las	lun 02/03/20	vie 12/11/21	0%	SE
378			Promover la participación en ferias de Empleo y la atención personalizada a los egresados de los cursos de capacitación de la FCS, a efecto de que las personas buscadoras de empleo encuentren alternativas de empleo u ocupación productiva.	lun 02/03/20	vie 12/11/21	0%	SE
379		7.3.3	Promover una capacitación digital, continua y permanente, flexible y adaptable a las necesidades del usuario final, utilizándola de forma intensiva para que la población acceda a nuevas formas de alfabetización	mié 01/07/20	dom 31/10/21	0%	SE
380		7.3.4	Promover la certificación profesional en TIC y la capacitación con valor curricular	mié 01/07/20	dom 31/10/21	60%	SE
381		**8**	**Utilizar las TIC para hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación detonantes del desarrollo de la competitividad y del progreso económico y social**	**mié 01/07/20**	**dom 31/10/21**	**0%**	**SE**
382		**8.1**	**Aumentar la proporción de profesionales y técnicos graduados en ingeniería, ciencias exactas y programación, con énfasis en la equidad de género**	**mié 01/07/20**	**dom 31/10/21**	**0%**	**SE**

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
383		8.1.1	Impulsar el desarrollo de formación de profesionistas en áreas de especialización TIC, incluyendo ingeniería, ciencias exactas y programación	mié 01/07/20	dom 31/10/21	0%	SE
384		8.1.2	Promover la interacción entre las universidades e instituciones de tecnología e innovación científica con la industria y la iniciativa privada con el fin de promover el desarrollo, estudio y ejercicio de la tecnología e innovación	mié 01/07/20	dom 31/10/21	0%	SE
385		8.1.3	Ampliar la divulgación de la ciencia y la tecnología en los planteles educativos, definiendo un plan de acción que aborde la materia de manera holística	mié 01/07/20	dom 31/10/21	0%	SE
386		8.1.4	Generar entre el alumnado de las carreras de ingenierías y ciencias exactas la cultura del Registro de Patentes de los proyectos que éste desarrolle	mié 01/07/20	dom 31/10/21	0%	SE
387			**Inclusión y Participación Ciudadana**	**jue 11/02/16**	**vie 31/12/21**	**57%**	**SPYF,ICSIC**
388		**9**	**Fomentar la participación social en la planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas**	**jue 11/02/16**	**vie 19/11/21**	**74%**	**SPYF,CPSEC,ICSIC**
389		**9.1**	**Adoptar estándares y modelos de participación e interacción ciudadana a través de canales electrónicos en el 100% de las instituciones gubernamentales de Colima**	**mié 04/09/19**	**vie 19/11/21**	**49%**	**SPYF,CPSEC**

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id		Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
390			**9.1.1**	**Definir un modelo de participación ciudadana en donde se incorpore el uso de TIC como herramienta estratégica para mejorar el vínculo entre la ciudadanía y el Sector Público.**	**lun 27/01/20**	**mar 30/06/20**	**99%**	**SPYF,CPSEC**
391				Definir modelo	lun 27/01/20	vie 07/02/20	100%	SPYF,CPSEC
392				Definir plan de trabajo para el desarrollo del sistema	lun 10/02/20	vie 21/02/20	100%	ICSIC
393				Desarrollo e Implementación del sistema	lun 24/02/20	mar 30/06/20	100%	SPYF,ICSIC
394			9.1.2	Impulsar modelos de participación ciudadana en las administraciones municipales en conjunto con el ejecutivo Estatal y en común acuerdo.	mié 01/07/20	mar 06/04/21	0%	SPYF
395			**9.1.3**	**Dotar a los organismos del sector público de nuevos canales, basados en instrumentos tecnológicos adecuados, para "oír la voz" de la ciudadanía, promoviendo la transparencia proactiva y la generación de datos abiertos.**	**mié 04/09/19**	**vie 30/04/21**	**99%**	**SPYF**
396				Buzones Electrónicos de Participación(Atención Ciudadana, Contraloría, etc)	mié 04/09/19	jue 31/12/20	100%	DDAD
397				Rediseñar los accesos a los buzones	jue 21/01/21	vie 30/04/21	100%	ICSIC
398			9.1.4	Diseñar un programa de educación cívica digital para la ciudadanía y para las organizaciones de la sociedad civil, que abone a la inclusión social.	mié 01/07/20	dom 31/10/21	0%	SPYF
399			**9.1.5**	**Diseñar una estrategia de difusión de las plataformas del Sector Público para la participación de la ciudadanía.**	**mié 01/07/20**	**vie 19/11/21**	**50%**	**SPYF**

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
400			Diseñar estrategia	mié 01/07/20	mar 14/07/20	50%	SPYF
401			Implementar estrategia	mié 15/07/20	vie 19/11/21	50%	SPYF
402		**9.2**	**Implementar en todas las dependencias de la entidad la política de datos abiertos del gobierno federal**	**jue 11/02/16**	**dom 31/10/21**	**86%**	**ICSIC**
403		**9.2.1**	**Facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de los datos considerados de carácter público puestos a disposición de cualquier persona.**	**jue 11/02/16**	**jue 31/12/20**	**92%**	**ICSIC**
404			Adopción de la Carta Internaciónal de Gobierno Abierto	jue 11/02/16	vie 26/02/16	100%	ICSIC
405			Instalación del Consejo de Datos Abiertos del Gobierno del Estado	vie 26/02/16	mar 06/09/16	100%	ICSIC
406			Convenio de Datos Abiertos con Gobierno Federal	mar 06/09/16	mié 03/05/17	100%	ICSIC
407			Desarrollo Portal Estatal de Datos Abiertos	mié 03/05/17	jue 31/08/17	100%	ICSIC
408			Actualizar enlaces de las dependencias	jue 20/02/20	jue 05/03/20	87%	Trámites y Servicios
409			Preparar material para propuesta de curso de capacitación	jue 20/02/20	jue 31/12/20	80%	Trámites y Servicios
410			Enviar y/o publicar lineamientos	jue 20/02/20	jue 05/03/20	100%	Trámites y Servicios
411			Enviar diagnóstico inicial	jue 20/02/20	vie 13/03/20	85%	Trámites y Servicios
412			Invitar dependencias faltantes (16 organismos)	lun 16/03/20	vie 29/05/20	87%	Trámites y Servicios
413		**9.2.2**	**Promover la participación ciudadana a través del uso de datos abiertos**	**mié 21/11/18**	**dom 31/10/21**	**67%**	**ICSIC**
414			Premiación uso de datos abiertos en hackathon 2018	mié 21/11/18	mié 19/12/18	100%	ICSIC
415			Promover en redes sociales	mié 01/07/20	dom 31/10/21	0%	Trámites y Servicios

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

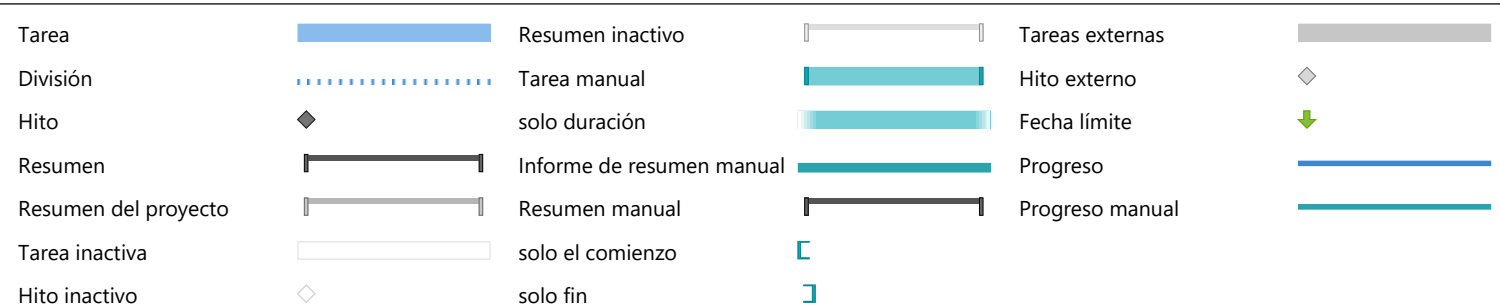

Id	Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
416			Promover en portal único	mié 01/07/20	dom 31/10/21	100%	Trámites y Servicios
417			Sesionar Grupo de Fomento al Uso de DA	mié 01/07/20	dom 31/10/21	100%	Trámites y Servicios
418		**9.2.3**	**Actualizar periódicamente los datos abiertos que corresponden a cada dependencia**	**jue 20/02/20**	**dom 31/10/21**	**100%**	**ICSIC**
419			Diseñar reporte bimestral	jue 20/02/20	jue 05/03/20	100%	Trámites y Servicios
420			Enviar reporte bimestral sobre el estatus (Trimestral)	jue 20/02/20	dom 31/10/21	100%	Trámites y Servicios
421			Actualizar plataforma nacional	jue 20/02/20	dom 31/10/21	100%	Trámites y Servicios
422		**9.2.4**	**Gestionar la participación de las Administraciones Municipales en la Política de datos abiertos**	**jue 01/10/20**	**dom 31/10/21**	**100%**	**ICSIC**
423			Invitar municipio	jue 01/10/20	dom 31/10/21	100%	Coordinación Técnic
424		**10**	**Diseñar y ejecutar políticas de inclusión digital para los grupos o sectores más desfavorecidos o excluidos**	**mar 01/03/16**	**vie 31/12/21**	**32%**	**ICSIC**
425		**10.1**	**Mejorar los indicadores de inclusión digital de los grupos vulnerables**	**mar 01/03/16**	**vie 31/12/21**	**32%**	**ICSIC**
426		**10.1.1**	**Integrar un Comité Interinstitucional sobre inclusión y participación ciudadana para la Agenda Digital de Colima**	**mié 05/02/20**	**vie 21/02/20**	**100%**	**ICSIC**
427			Definir integrantes	mié 05/02/20	jue 06/02/20	100%	ICSIC
428			Elaborar acta de instalación	jue 06/02/20	lun 10/02/20	100%	ICSIC
429			Instalar el comité	lun 17/02/20	vie 21/02/20	100%	ICSIC
430		**10.1.2**	**Realizar un diagnóstico sobre los usos y aprovechamientos de las TIC, diferenciado por grupos de población en el estado**	**lun 02/03/20**	**mar 30/06/20**	**100%**	**ICSIC**

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

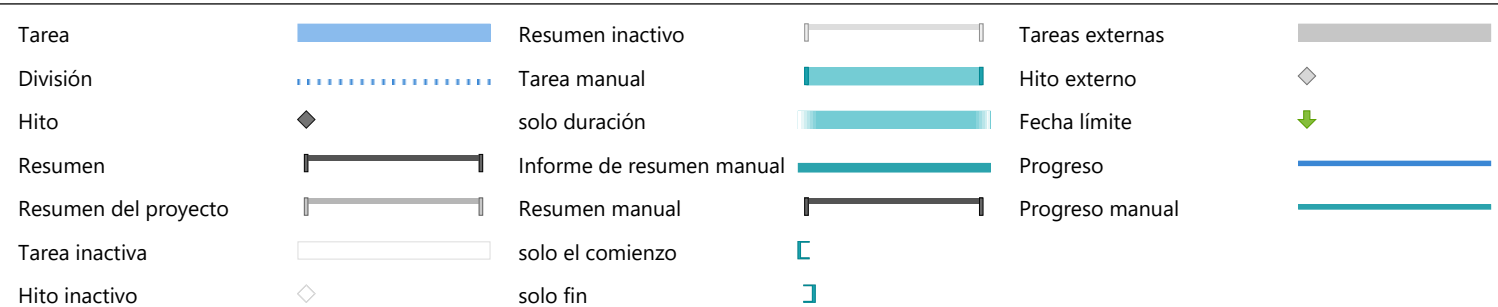

Id		Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completad	Nombres de los recursos
431				Elaborar instrumento de diagnóstico	lun 02/03/20	mar 31/03/20	100%	ICSIC
432				Implementar diagnóstico	mié 01/04/20	mar 30/06/20	100%	ICSIC
433			10.1.3	Diseñar e impartir talleres de alfabetización digital con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, orientados a la atención de carencias y necesidades específicas de grupos definidos	mié 01/07/20	jue 30/09/21	0%	ICSIC
434			**10.1.4**	**Elaborar un Programa de Alfabetización Digital para reclusos con el fin de reinsertarlos a la sociedad**	**mié 01/07/20**	**jue 30/09/21**	**69%**	**ICSIC**
435				Prepa en línea	mar 01/03/16	sáb 31/12/16	100%	SE
436				MEVyT VIRTUAL	mar 01/03/16	sáb 31/12/16	100%	IEEA
437				Cursos de Computación	mar 01/03/16	sáb 31/12/16	100%	CECATI
438				Otros programas	mié 12/08/20	jue 30/09/21	0%	ICSIC
439			10.1.5	Promover en las comunidades rurales, campañas de Alfabetización Digital con un enfoque práctico, donde se les enseñe a utilizar aplicaciones y recursos que se requieren en la vida diaria	mié 01/07/20	jue 30/09/21	0%	ICSIC
440			10.1.6	Crear un Programa Integral que considere el uso de las TIC en zonas vulnerables de la ciudad	mié 01/07/20	jue 30/09/21	0%	ICSIC
441			10.1.7	Promoción y difusión de proyectos innovadores liderados por grupos vulnerables	mié 01/07/20	jue 30/09/21	0%	ICSIC
442			**10.1.8**	**Desarrollar y difundir aplicaciones que den accesibilidad a las personas con discapacidad a todas las plataformas de gobierno**	**jue 01/08/19**	**vie 31/12/21**	**62%**	**ICSIC**
443				Actas de Registro Civil impresas en braille	jue 01/08/19	mar 03/12/19	100%	ICSIC

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	N°	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completac	Nombres de los recursos
444				Portal Único accesible para débiles visuales	lun 01/02/21	mar 13/07/21	100%	ICSIC
445				Portal Único accesible para invidentes	mar 13/07/21	vie 31/12/21	0%	ICSIC
446			10.1.9	Reforzar la inclusión digital con perspectiva de género a través de la capacitación en TIC para el trabajo de las mujeres	mié 01/07/20	jue 30/09/21	0%	ICSIC

Proyecto: Proyectos ICSIC 2018
Fecha: jue 07/10/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	
